

Vand
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand



AARHUS VAND A/S

Hasselager Allé 29
8260 Viby J
DK

22. januar 2025
Side 1 af 4

Tilsynsrapport 2024, Bispehavens vandtårn

Aarhus Kommune har den 20. november 2024 ført tilsyn med Bispehavens vandtårn, beliggende Bispehavevej 22, 8220 Brabrand.

Vandtårnet fremstår i god stand. Som en del af Aarhus Vands strukturplan skal vandtårnet nedlægges og erstattes af en ny beholder på lokaliteten.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til det fremsendte er I velkommen til at skrive eller ringe.

Med venlig hilsen

Rikke Sølling
Geolog

Ida Høier Jensen
Miljøsagsbehandler

TEKNIK OG MILJØ

Natur og Miljø
Aarhus Kommune

Vand

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Direkte telefon: 24 96 78 59

Direkte e-mail:
rivs@aarhus.dk

Sag: GEO-2013-029524
Dokumentnummer:
13634259

Sagsbehandler:
Rikke Sølling



Tilsynsattest – beholdere/pumpestationer

22. januar 2025
Side 2 af 4

Kommune:	Aarhus Kommune
Anlæg:	Bispehavens vandtårn, Aarhus Vand
Tilsynsdato:	20. november 2024
Repræsentant for Århus Vand:	Jakob Nygaard Jørgensen, Anders Bo Sørensen og Rasmus Bærentzen
Tilsynsførende:	Ida Høier Jensen og Rikke Sølling, Aarhus Kommune
Bemærkninger:	



Bygninger og inventar


22. januar 2025

Side 3 af 4

Rentvandsbeholder – højdebeholder – vandtårn			
Indhegnet	Ja	Nej X	
Utætheder	Ja	Nej X	
Aflåst dør eller lem	Ja X	Nej	
Ventilationsåbn. beskyttet	Ja X	Nej	
Overløbsrør beskyttet	Ja X	Nej	
Renholdt og ryddeligt	Ja X	Nej	
Bemærkninger: Vandbeholderen er senest inspiceret i 7. september 2020, hvor det blev konkluderet, at tanken er i god stand.			
Vedligeholdelsestilstand			
Udv. vedligeholdelse af bygning	God X	Acceptabel	Dårlig
Indv. vedligeholdelse af bygning	God X	Acceptabel	Dårlig
Rentvandspumper Antal:	God	Acceptabel	Dårlig
Plac. af prøvetagningshane ok	Ja X	Nej	
Hjælpemaskiner f.eks. kompressor	God	Acceptabel	Dårlig
Vandmålere	God X	Acceptabel	Dårlig
Andre instrumenter, herunder affugter	God X	Acceptabel	Dårlig
Ventiler og styreorganer	God X	Acceptabel	Dårlig
Synlige rør	God X	Acceptabel	Dårlig
El-installation	God X	Acceptabel	Dårlig
Bemærkninger: Der er ikke installeret pumper i beholderen da ledningsnettet forsynes via gravitation.			
Sikkerhedsforhold	Gode X	Acceptable	Dårlige
Bemærkninger: Adgangskontrol, alarm og overvågning af beholder og pumpebygning.			



nuar 2025
af 4

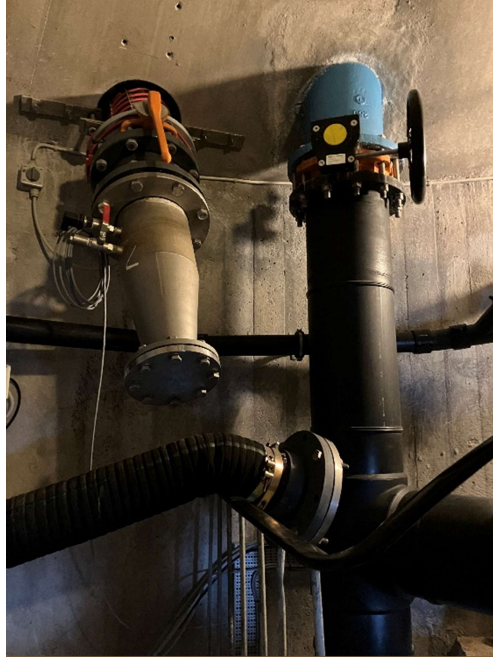

Bundtømmerør



Prøvetagningshane



Overløb
